Rapport du 10 novembre 2026

Avancement par module

Fusion Leap AI Growth : plateforme SaaS multi-tenant de croissance (CRM, canaux, campagnes, agents IA). Les fondations (sécurité, multi-tenant, authentification, membres, couche service, audit, worker, plans et quotas) sont en place ; les modules produit commencent après le jalon G1. Jours **J0 à J27** réalisés sur 68.



30 / 68
jours réalisés
(J0 → J27)

6 886
tests automatisés,
tous verts

34
PR créées
(7 fusionnées, 27 en revue)

14
ADR rédigés
(1 accepté)


En une phrase

Phase 1 terminée : l'isolation de deux entreprises est démontrée (jalon G1, GO à valider par la responsable technique) ; le CRM démarre ensuite. S'y ajoutent, hors plan, le français par défaut, une refonte UI complète et un module « Paramétrage » (palette et logo).

Fait · En revue (PR ouverte) · À valider · À faire

Avancement par phase

jours réalisés



Phase 0 — Découverte technique 4 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	REMARQUE
J0	Analyse de la spec	100 %	Fait	Lacunes, questions, plan validé.
J1	ADR et modèle de données	100 %	À valider	14 ADR ; seul le 011 est accepté.
J2	Intégrations et flux	100 %	Fait	WhatsApp, Salla, e-mail, CRM.
J3	Menaces, tests, backlog	100 %	À valider	53 menaces STRIDE ; C0 NO-GO provisoire.

Phase 1 — Fondations 12 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J4	Monorepo et CI	100 %	Fait	pnpm + Turborepo, CI GitHub (2 jobs).
J5	Environnements et secrets	100 %	Fait	Validation zod, garde-fou anti-fuite.
J6	Noyau multi-tenant (base)	100 %	Fait	Organisations, membres, plans, abonnements.
J7	RLS et harnais de test	100 %	Fait	Politiques par opération, tests via l'API.
J8	Authentification bilingue	100 %	Fait	Supabase SSR, sessions, redirections sûres.
J9	Organisations et contexte actif	100 %	Fait	Création atomique, sélecteur d'organisation.
J10	Membres, invitations, RBAC	100 %	Fait	Matrice ADR 014, jetons hachés.
J11	Couche service	100 %	Fait	Idempotence, limitation de débit, erreurs.
J12	Audit et journaux	100 %	En revue	Audit en lecture seule, logger JSON (PR n°8).
J13	Jobs et worker	100 %	En revue	File Postgres, claim, bail, dead letter (PR n°10).
J14	Plans et quotas	100 %	En revue	Quotas atomiques, Platform Admin, écran d'administration.
J15	Jalon G1 : isolation	100 %	En revue	T1 et T5 automatisés (35 tests), audit C1 : GO avec réserves à valider.

Phases 2 à 5 — Modules produit

non commencés ou en cours

Ordre de priorité de la spec : isolation, CRM, inbox, campagnes, IA, rapports. Chaque jalon (G2 à G5) est une porte de qualité.

Phase 2 — Ventes et CRM 12 jours

100 %

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
Projets et produits	100 %	En revue	J16 : base, quotas, API. J17 : écran complet et fichiers (Storage privé, liens signés), revue sécurité corrigée.
Contacts, consentement, désabonnement	100 %	En revue	J18 contacts et consentement, J19 pipelines / leads / deals, J20 activités et chronologie livrés ; désabonnement avec l'e-mail (J31–33).
Leads, deals, pipelines	100 %	En revue	Livré aux J19–J20 (pipelines, leads, deals, activités) et J24 (écrans leads, deals et export).
Capture publique, assignation, import CSV	100 %	En revue	J21 à J23 livrés (capture publique, assignation automatique et alertes, import CSV avec aperçu et rapport).
Adaptateur CRM · Gate G2	100 %	En revue	Adaptateur CRM (J25), tests ventes (J26) et parcours lead → deal gagné avec historique (J27) livrés ; checkpoint C2 rédigé : GO avec réserves proposé, décision de la responsable technique.

Phase 3 — Canaux 19 jours

10 %

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
Intégrations et secrets	66 %	À valider	Intégrations, canaux et secrets (J28) et pipeline webhook (J29) livrés ; conversations (J30) à faire.
Webhooks et e-mail	0 %	À faire	
WhatsApp Cloud API	0 %	À faire	Compte Meta bloquant
Inbox unifiée · Gate G3	0 %	À faire	Envoi, réception, arrêt sûrs
Écrans CRM : contacts et fiche lead (décision C2)	0 %	À faire	Avant le premier envoi (contacts) et avant la boîte de réception (fiche lead)
Écrans CRM : configuration et import (décision C2)	0 %	À faire	Clés de formulaire, règles d'assignation, notifications, import ; avant G3

Phase 4 — Croissance 12 jours

0 %

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
Campagnes, segments, approbation, UTM	0 %	À faire	
Agents IA (brouillons validés par un humain)	0 %	À faire	
Tableau de bord · Gate G4	0 %	À faire	Campagne auditable

Phase 5 — Pilote SaaS 9 jours


0 %

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
Onboarding, Salla (mode marketing)	0 %	À faire	

Réalisé en plus du plan demandes du propriétaire du produit

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	CONTENU
Français par défaut (fr / ar / en)	100 %	Fait	Locale française par défaut, arabe (RTL) et anglais ; PR n°5.
Refonte UI (Tailwind + shadcn)	100 %	Fait	Coque d'application, thème clair/sombre, accessibilité ; PR n°7.
E-mails locaux (Mailtrap)	100 %	Fait	Bac à sable SMTP ; mot de passe à saisir dans supabase/.env.
Paramétrage : palette de couleurs	100 %	En revue	Couleurs claires et sombres, aperçu, contraste AA ; PR n°9.
Paramétrage : logo	100 %	En revue	PNG, JPEG, WebP ≤ 128 Ko, SVG refusé ; PR n°9.
Rapport d'avancement automatisé	100 %	En revue	Généré à chaque commit : pnpm report:progress.
Guide de démarrage pour un nouveau développeur	100 %	En revue	start-fusion-lead-ai-growth.md : prérequis, installation, comptes de test, tests.
Paramétrage : serveur SMTP (Mailtrap)	100 %	En revue	Mot de passe chiffré (AES-256-GCM), test d'envoi, administrateurs de la plateforme.

Qualité mesurée tests automatisés, tous verts 6 886

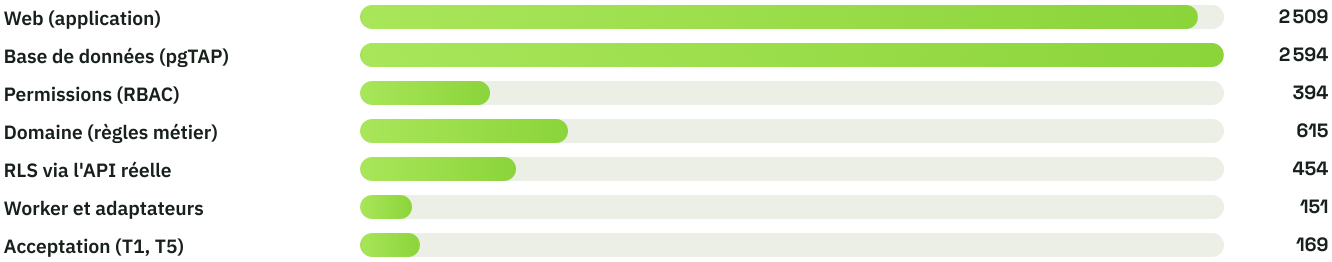

Contrôles automatiques

Lint, typecheck, build de production avec l'environnement de la CI, recherche de fuites de secrets dans le bundle navigateur : tous verts. La CI GitHub (2 jobs) exécute le tout à chaque PR.

Sécurité

Chaque jour passe une revue adverse (attaques réelles contre la base locale) puis une re-vérification : isolation entre organisations, journal d'audit non modifiable, quotas atomiques, aucun secret dans les logs. Aucune faille exploitable ouverte.

Points ouverts et décisions à prendre

À traiter par la responsable technique ou le propriétaire du produit.

- [ ] Fusionner dans l'ordre les PR n°8 (J12), n°9 (Paramétrage) et n°10 (J13), puis ouvrir la PR de J14.
- [ ] Accepter les ADR encore « Proposed » (dont 014 : droits, 015 : kit UI, 016 : palette et logo). C0 reste NO-GO provisoire tant que c'est en attente.
- [ ] Valider les valeurs des plans (trial, starter, growth) : elles sont provisoires, la spec n'en donne aucune.
- [ ] Paramétrage global : un owner ou admin de n'importe quelle organisation change les couleurs et le logo de toute la plateforme. À remplacer par le Platform Admin avant de vrais clients.
- [ ] Abonnement past_due ou fin d'essai dépassée : toujours utilisable (pas d'expiration automatique).
- [ ] Questions Q1 (CRM), Q2 (domaine e-mail), Q5 (marché / région) toujours sans réponse.
- [ ] Compte développeur Meta bloqué (« compte trop récent ») : WhatsApp est critique pour J34.
- [ ] Choisir l'hébergeur (ADR 010) avant J58 et le fournisseur IA (ADR 012) avant J47.
- [ ] Rétention du journal d'audit et des jobs terminés (J57) : sinon croissance sans limite.
- [ ] Saisir le mot de passe Mailtrap dans supabase/.env pour recevoir les e-mails d'inscription en local.

Prochaines étapes

QUAND	ACTION
Maintenant	Relecture et fusion des PR ; arbitrage sur les ADR 014 à 016 et sur les valeurs des plans.
Après le GO du C1	Décision GO / NO-GO du C1, puis J16 : projets et produits.
J16 à J27	Ventes et CRM : projets, contacts et consentement, leads et deals, import CSV.

Comment lire ce rapport

Avancement d'un module = part de ses livrables terminés et vérifiés. **100 %** = code, tests et documentation livrés ; « En revue » = PR ouverte, pas encore fusionnée. Avancement global = jours réalisés sur 68 (30 ÷ 68 = 44,1 %). Rapport régénéré à chaque commit (`pnpm report:progress` , branche `day-29-webhooks`). Sources : `docs/progress/journal.md` , `docs/plan/development-plan.md` , `scripts/progress-report/data.json` .
