Rapport du 14 novembre 2026

Rapport d’avancement

Fusion Leap AI Growth : plateforme SaaS multi-tenant de croissance (CRM, canaux, campagnes, agents IA). Les fondations, le CRM (projets, contacts, leads, deals, capture, import) et le socle des canaux e-mail (intégrations, webhooks, conversations, envoi sous contrôles, statuts et réception) sont en place et fusionnés. Jours **J0 à J32** réalisés sur 68.



33 / 68
jours réalisés

7 404
tests automatisés, tous verts

20 / 33
modules terminés

40 / 46
PR fusionnées
(6 en revue)

12 / 14
décisions d'architecture (ADR)
acceptées

21
failles trouvées par les revues adverses, toutes corrigées

DEPUIS LE 12 NOV. **0 point** d'avancement 0 jour 0 test

FUSION

40 PR fusionnées

Tout le travail de J0 à J32 est dans la branche principale, un commit par sujet.

ENVOI SOUS CONTRÔLES

15 contrôles avant chaque e-mail

Approbation humaine obligatoire, puis contrôle final juste avant l'appel au fournisseur.

RÉCEPTION SÛRE

Aucun contact créé par un inconnu


Une réponse est rattachée à la bonne conversation ; un expéditeur inconnu ou usurpé va dans une file de tri.

En une phrase

Les phases 0 à 2 sont terminées et fusionnées ; la phase 3 (canaux) est bien engagée : un e-mail ne part qu'avec une approbation humaine et un contrôle final dans le worker, les statuts du fournisseur et les réponses sont rattachés sans jamais créer de contact. Rien ne peut encore partir pour de vrai : il manque le désabonnement (J33), l'écran contacts et consentement (J30b), l'activation d'un canal et le compte d'essai du fournisseur (checkpoint C3).

Avancement par phase

jours réalisés



Journal du jour 14 novembre 2026

Le travail du jour raconté étape par étape : ce qui a été fait, les vérifications menées et le volume de code touché.

J'ai ajouté en base le secret de webhook par intégration, la file des e-mails non rattachés et les fonctions qui appliquent statuts et réponses.

Migration et retour arrière écrits · Tests pgTAP lancés

J'ai écrit l'adaptateur Postmark (authentification, événements normalisés, contrôle SPF), le traitement côté worker et l'endpoint du secret.

Adaptateur, worker et route web · Tests unitaires lancés

J'ai ajouté les tests d'acceptation du flux e-mail puis la documentation (API, runbook, ADR).

Tests d'acceptation lancés · Documentation mise à jour

J'ai fusionné la chaîne de PR dans la branche principale, en gardant un commit par sujet.

PR rebasées sur main · Aucune branche supprimée

J'ai écrit le guide de tests des phases 2 et 3 (107 cas) et les outils d'appel de l'API, puis vérifié les résultats attendus sur l'application réelle.

Scénarios exécutés · Pages du PDF capturées



Couverture du guide


Un cas de test

J'ai refondu le rapport d'avancement en 7 pages, avec historique et comparaison avec le rapport précédent.

PDF régénéré · Pages capturées



Synthèse



Feuille de route

J'ai corrigé l'erreur de `pnpm dev` (module ES chargé par Turbopack) et mis à jour le runbook.

Correction vérifiée · CI verte

Feuille de route


jalons, courbe d'avancement, phases

Les jalons sont des portes de qualité : on ne les franchit qu'avec les preuves.

G1 · Isolation	J15	Isolation de deux entreprises démontrée
G2 · Parcours CRM	J27	Lead jusqu'au deal gagné, avec historique
C2 · Écrans CRM	9 nov. 2026	Option A : écrans avant G3
C3 · Compte d'essai e-mail	avant tout envoi réel	Fournisseur confirmé sur un compte d'essai
G3 · Canaux	18 janv. 2027	Boîte unifiée, envoi et réception sûrs
Fin du pilote	16 févr. 2027	Phase 5 : pilote avec un client

Avancement global au fil des jours

Part des 68 jours du plan réalisés, mesurée à chaque rapport.

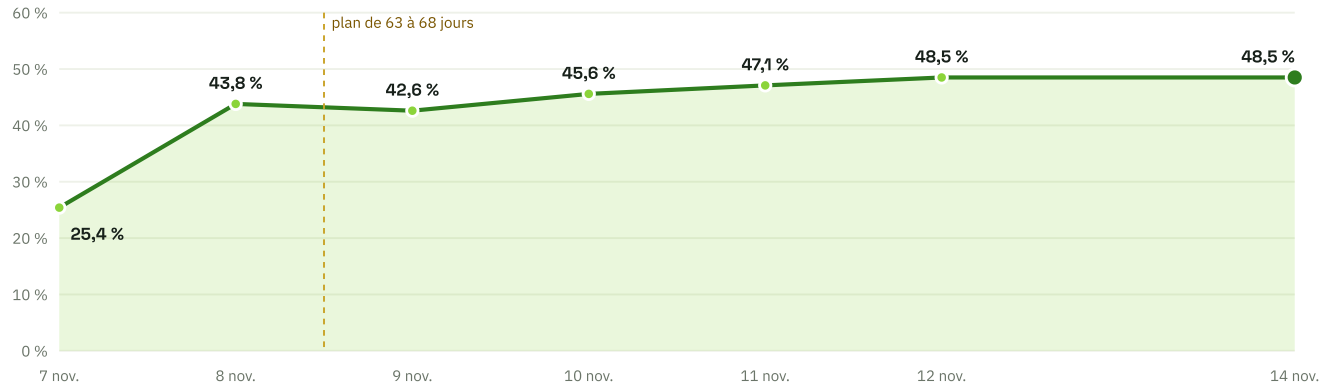

Phase 0 · Découverte technique — 100%

4 / 4 jours · 4 modules
2 faits · 2 à valider

Phase 1 · Fondations — 100%

12 / 12 jours · 12 modules
12 faits

Phase 2 · Ventes et CRM — 100%

12 / 12 jours · 5 modules
5 faits

Phase 3 · Canaux — 26%

5 / 19 jours · 6 modules
1 fait · 1 à valider · 4 à faire

Phase 4 · Croissance — 0%

0 / 12 jours · 3 modules
3 à faire

Phase 5 · Pilote SaaS — 0%

0 / 9 jours · 3 modules
3 à faire

35 jours
restent à réaliser sur 68 (51,5 % du plan)

18 janv. 2027
prochain jalon daté : G3 · Canaux

J33
prochaine journée : désabonnement, prérequis du premier envoi marketing

Phase 0 — Découverte technique 4 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J0	Analyse de la spec	100 %	Fait	Lacunes, questions, plan validé.
J1	ADR et modèle de données	100 %	À valider	Décisions d'architecture (ADR) et modèle de données rédigés.
J2	Intégrations et flux	100 %	Fait	WhatsApp, Salla, e-mail, CRM.
J3	Menaces, tests, backlog	100 %	À valider	53 menaces STRIDE, plan de tests et backlog.

Phase 1 — Fondations 12 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J4	Monorepo et CI	100 %	Fait	pnpm + Turborepo, CI GitHub (2 jobs).
J5	Environnements et secrets	100 %	Fait	Validation zod, garde-fou anti-fuite.
J6	Noyau multi-tenant (base)	100 %	Fait	Organisations, membres, plans, abonnements.
J7	RLS et harnais de test	100 %	Fait	Politiques par opération, tests via l'API.
J8	Authentification bilingue	100 %	Fait	Supabase SSR, sessions, redirections sûres.
J9	Organisations et contexte actif	100 %	Fait	Création atomique, sélecteur d'organisation.
J10	Membres, invitations, RBAC	100 %	Fait	Matrice ADR 014, jetons hachés.
J11	Couche service	100 %	Fait	Idempotence, limitation de débit, erreurs.
J12	Audit et journaux	100 %	Fait	Audit en lecture seule, journal JSON.
J13	Jobs et worker	100 %	Fait	File Postgres, claim, bail, dead letter.
J14	Plans et quotas	100 %	Fait	Quotas atomiques, Platform Admin, écran d'administration.
J15	Jalon G1 : isolation	100 %	Fait	Jalon G1 : T1 et T5 automatisés, audit C1.

Réalisé en plus du plan demandes du propriétaire du produit

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	CONTENU
Français par défaut (fr / ar / en)	100 %	Fait	Locale française par défaut, arabe (RTL) et anglais ; PR n°5.
Refonte UI (Tailwind + shadcn)	100 %	Fait	Coque d'application, thème clair/sombre, accessibilité ; PR n°7.
E-mails locaux (Mailtrap)	100 %	Fait	Bac à sable SMTP ; mot de passe à saisir dans supabase/.env.
Paramétrage : palette de couleurs	100 %	Fait	Couleurs claires et sombres, aperçu, contraste AA ; PR n°9.
Paramétrage : logo	100 %	Fait	PNG, JPEG, WebP ≤ 128 Ko, SVG refusé ; PR n°9.
Rapport d'avancement automatisé	100 %	Fait	Généré à chaque commit : pnpm report:progress.
Guide de démarrage pour un nouveau développeur	100 %	Fait	start-fusion-lead-ai-growth.md : prérequis, installation, comptes de test, tests.
Paramétrage : serveur SMTP (Mailtrap)	100 %	Fait	Mot de passe chiffré (AES-256-GCM), test d'envoi, administrateurs de la plateforme.
Guide de tests des phases 2 et 3 (PDF)	100 %	Fait	107 cas (interface et technique), fiche de résultats, données de démonstration et outil d'appel de l'API.
Refonte du rapport d'avancement	100 %	Fait	7 pages : synthèse, feuille de route, détail par phase, livré récemment, qualité, décisions ; historique et comparaison avec le rapport précédent.

Phase 2 — Ventes et CRM 12 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J16–J17	Projets et produits	100 %	Fait	J16 base, quotas, API ; J17 écran complet et fichiers (stockage privé, liens signés).
J18–J20	Contacts, leads, deals, activités	100 %	Fait	J18 contacts et consentement, J19 pipelines, leads et deals, J20 activités et chronologie.
J21–J23	Capture publique, assignation, import CSV	100 %	Fait	J21 formulaire public (clé, anti-abus), J22 assignation automatique et alertes, J23 import CSV avec aperçu et rapport.
J24–J26	Écrans CRM, adaptateur, tests de vente	100 %	Fait	J24 écrans leads, deals et export audité, J25 adaptateur CRM (fichier), J26 tests des rôles de vente.
J27	Parcours complet · Jalon G2	100 %	Fait	Parcours lead jusqu'au deal gagné avec historique ; checkpoint C2 : écrans CRM planifiés avant G3.

Phase 3 — Canaux 19 jours 26 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J28–J30	Intégrations et secrets	100 %	Fait	J28 intégrations et secrets chiffrés, J29 pipeline des webhooks, J30 conversations et messages.
J31–J33	Envoi, statuts et réception e-mail · désabonnement	67 %	À valider	J31 envoi sous contrôles, J32 statuts du fournisseur et réponses ; J33 désabonnement à faire.
J34–J37	WhatsApp Cloud API	0 %	À faire	Compte Meta bloquant
J38–J41	Inbox unifiée · Gate G3	0 %	À faire	Envoi, réception, arrêt sûrs
J30b–J30d	Écrans CRM : contacts et fiche lead (décision C2)	0 %	À faire	Avant le premier envoi (contacts) et avant la boîte de réception (fiche lead)
J39b–J39c	Écrans CRM : configuration et import (décision C2)	0 %	À faire	Clés de formulaire, règles d'assignation, notifications, import ; avant G3

Phase 4 — Croissance 12 jours 0 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
J42–J46	Campagnes, segments, approbation, UTM	0 %	À faire	
J47–J50	Agents IA (brouillons validés par un humain)	0 %	À faire	
J51–J53	Tableau de bord · Gate G4	0 %	À faire	Campagne auditable

Phase 5 — Pilote SaaS 9 jours 0 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
J54–J55	Onboarding, Salla (mode marketing)	0 %	À faire	
J56–J59	Console admin, durcissement, staging	0 %	À faire	
J60–J62	Recette · Gate G5	0 %	À faire	10 critères d'acceptation

Livré récemment

J28 à J32 : le socle des canaux e-mail

Chaque journée est validée par des tests, puis attaquée par une revue de sécurité indépendante avant la fusion.

J28 Intégrations et secrets

- Intégrations e-mail et WhatsApp, canaux, secrets chiffrés (jamais lisibles ni renvoyés).
- Rotation et déconnexion qui supprime le secret.

Preuves : pgTAP, API réelle et acceptation HTTP · revue de sécurité faite

J29 Réception des webhooks

- Route publique sans session, entreprise retrouvée par le compte du fournisseur, jamais par le contenu.
- Déduplication, rejets tracés sans contenu, traitement différé par le worker.

Preuves : pipeline pur testé, acceptation HTTP · revue de sécurité faite

J30 Conversations et messages

- Un fil par contact et canal ; un message ne peut pas porter une autre entreprise que son fil.
- Lecture par rôle : le commercial ne lit que ses conversations.

Preuves : 126 tests de base, 12 tests API · Revue de sécurité : 0 bloquant 2 majeurs 5 moyens

J31 Envoi d'e-mail sous contrôles

- Approbation humaine obligatoire, contrôle final juste avant l'appel dans le worker.
- Au plus un envoi par message ; « accepté » n'est pas « livré ».

Preuves : 94 tests de base, 10 tests API, 30 tests worker · Revue de sécurité : 0 bloquant 2 majeurs 5 moyens

J32 Statuts et réception d'e-mail

- Livré, rebond dur (adresse supprimée) et plainte (adresse supprimée et « ne plus contacter »).
- Une réponse est rattachée à la bonne conversation ; un expéditeur inconnu ou usurpé va dans une file de tri, jamais dans un contact.

Preuves : 114 tests de base, 9 tests API, acceptation HTTP réelle · Revue de sécurité : 1 bloquant 1 majeur 5 moyens

Déjà possible

- Gérer projets, contacts, leads et deals, avec rôles et isolation entre entreprises.
- Importer des contacts (CSV), capturer des leads par formulaire public, les assigner automatiquement.
- Connecter une intégration e-mail, avec secrets chiffrés et jamais renvoyés.
- Préparer un envoi : approbation humaine, 15 contrôles juste avant l'appel.
- Recevoir les statuts du fournisseur et les réponses, rattachés à la bonne conversation.

Pas encore possible

- Envoyer ou recevoir un vrai e-mail : il manque l'activation d'un canal et un compte d'essai (C3).
- Se désabonner (J33) : aucun envoi marketing avant ce lien.
- Gérer les contacts et le consentement à l'écran (J30b) et lire les conversations (boîte de réception, J37).
- WhatsApp (J34 à J37) : en attente du compte Meta.

Qualité mesurée

tests automatisés, tous verts

7 404 tests au total (0 test depuis le 12 nov.).


Tests par catégorie

Ce que couvre chaque ligne.

Web (application) Écrans, routes HTTP et services de l'application		2 523
Base de données (pgTAP) Tables, droits et règles de la base de données		2 928
Permissions (RBAC) Qui a le droit de faire quoi, rôle par rôle		394
Domaine (règles métier) Règles métier pures (contrôles d'envoi, consentement…)		654
RLS via l'API réelle Isolation entre entreprises, vérifiée par la vraie API		485
Worker et adaptateurs Tâches de fond et adaptateurs de fournisseurs		235
Acceptation (T1, T5) Parcours complets en HTTP réel sur l'application construite		185

Tests au fil des jours

Total à chaque rapport.



Contrôles automatiques

Lint, typecheck, tests unitaires, base de données (pgTAP), isolation par l'API réelle (RLS), acceptation en HTTP réel, build de production et recherche de fuites de secrets dans le bundle navigateur : tous verts. La CI GitHub exécute trois jobs à chaque PR.

Sécurité

Chaque journée passe une revue adverse indépendante (attaques réelles contre la base locale, lecture critique du code) puis une re-vérification : isolation entre organisations, journal d'audit non modifiable, secrets chiffrés et jamais renvoyés, aucun contenu de message dans les journaux. Les failles trouvées sont corrigées avant la fusion ; aucune faille exploitable ouverte connue.

Revues de sécurité adverses

failles trouvées avant la fusion

JOUR	SUJET	RÉSULTAT
J30	Conversations et messages	0 bloquant · 2 majeurs · 5 moyens
J31	Envoi d'e-mail sous contrôles	0 bloquant · 2 majeurs · 5 moyens
J32	Statuts et réception d'e-mail	1 bloquant · 1 majeur · 5 moyens

Toutes ces failles sont corrigées avant la fusion, avec un test qui la reproduit. Un bloquant empêche la fusion ; un majeur est corrigé le jour même.

Points ouverts et décisions à prendre

À traiter par la responsable technique, le propriétaire du produit ou l'équipe.

#	POINT	QUI	ÉCHÉANCE
1	Réponse à Q2 (propriétaire du domaine d'envoi) et ouverture d'un compte d'essai Postmark : tout ce qui dépend du fournisseur est une hypothèse à confirmer (en-têtes des e-mails entrants, métadonnées des événements, codes de rebond).	Responsable technique	Avant C3
2	Aucun flux n'active encore un canal ou une intégration e-mail : sans lui, ni envoi ni réception réels.	Équipe	Avant C3
3	Désabonnement (J33) et écran contacts et consentement (J30b) : prérequis d'un premier envoi marketing.	Équipe	Avant le premier envoi
4	Q1 (API du CRM Fusion Leap) et Q5 (marché, région) : toujours sans réponse.	Responsable technique	Avant J34
5	Compte développeur Meta bloqué (« compte trop récent ») : WhatsApp est critique pour J34.	Propriétaire du produit	Avant J34
6	Choisir le fournisseur IA (ADR 012) et l'hébergeur (ADR 010).	Responsable technique	Avant J47 / J58
7	Effacement d'un contact qui a des messages (droit à l'effacement) : procédure d'anonymisation à définir.	Responsable technique	Avant le pilote
8	Purge des contenus conservés (événements de webhook, file de tri) et rétention du journal d'audit : sinon croissance sans limite.	Équipe	J39 / J57
9	Paramétrage de la palette et du logo : réservé aux administrateurs de la plateforme avant de vrais clients (condition de l'ADR 016).	Équipe	Avant J54
10	Protection de la branche principale non activée sur GitHub ; un test de base de données (conversations) a échoué deux fois sans cause trouvée.	Responsable technique	À surveiller

Prochaines étapes

QUAND	ACTION
Maintenant	Recette des phases 2 et 3 avec le guide de tests (PDF), par une personne qui n'a pas écrit le code.
J33	Désabonnement : jeton signé, en-têtes de désabonnement, page publique en arabe et en anglais, révocation du consentement et annulation des envois en attente.
J30b à J30d	Écrans contacts et consentement (avant le premier envoi), puis fiche lead (avant la boîte de réception).
J34 à J37	WhatsApp Cloud API et boîte de réception : dépend du compte Meta.
J38 à J41	Envoi et réception sûrs sur la boîte unifiée, jalon G3 le 18 janvier 2027.

Comment lire ce rapport

Avancement d'un module = part de ses livrables terminés et vérifiés : **100 %** = code, tests et documentation livrés. Statuts : Fait fusionné · En revue PR ouverte · À valider fait mais à valider · À faire à faire. Avancement global = jours réalisés sur 68 (33 ÷ 68 = 48,5 %). Rapport régénéré à chaque commit (`pnpm report:progress` , branche `day-30b-contacts`). Sources : `docs/progress/journal.md` , `docs/plan/development-plan.md` , `scripts/progress-report/data.json` , `scripts/progress-report/history.json` .
