Rapport d’avancement par module

Généré le 6 novembre 2026

Fusion Leap AI Growth — état au 6 novembre 2026. Jours J0 à J7 réalisés sur 63 ; les modules produit (CRM, canaux, campagnes, IA) ne sont pas encore commencés.

8 / 63
jours réalisés (J0 → J7)

12,7 %
avancement cumulé, cible du plan atteinte pour J7

176
tests automatisés écrits (22 + 70 + 84)

En une phrase

Les fondations de sécurité sont posées : monorepo, environnements, schéma multi-tenant et règles d'isolation (RLS) testées. La première exécution de la CI sur GitHub reste à faire, et plusieurs décisions (ADR, Q1/Q2/Q5) attendent la responsable technique.

Phase 0 — Découverte technique

Jour	Module	Statut	Livrable / remarque
J0	Analyse de la spec	Fait	Compréhension, lacunes et questions (`docs/analysis`), plan validé.
J1	ADR et modèle de données	Fait, à valider	ADR 001–008, 010–012, 014 et ERD ; tous encore « Proposed ».
J2	Intégrations et flux	Fait	Fiches WhatsApp, Salla, e-mail, CRM ; flux de données.
J3	Menaces, tests, backlog	Fait, à valider	53 menaces STRIDE, stratégie de test, backlog J4–J62. Checkpoint C0 : NO-GO provisoire tant que les ADR ne sont pas acceptés.

Phase 1 — Fondations

Jour	Module	Statut	Livrable / remarque
J4	Monorepo et CI	Fait, CI non exécutée	pnpm + Turborepo, lint, typecheck, workflow GitHub écrit mais jamais lancé.
J5	Environnements et secrets	Fait	Supabase local, validation zod des variables, garde-fou contre les fuites côté navigateur (22 tests).
J6	Migrations du noyau tenant	Fait	Organisations, membres, plans, abonnements, compteurs ; seed ; 70 tests pgTAP.
J7	RLS du noyau et harnais	Fait	Politiques par opération, garde dernier propriétaire, 84 tests RLS via l'API réelle.
J8	Auth SSR bilingue AR/EN	À faire	Prochaine étape ; décision next-intl (ADR 011) nécessaire.
J9	Organisations et contexte actif	À faire	
J10	Invitations et RBAC applicatif	À faire	Implémente la matrice de l'ADR 014.
J11–J12	Couche service, audit et logs	À faire	
J13–J14	Jobs / worker, plans et quotas	À faire	J13 jugé tendu (concurrence).
J15	Checkpoint C1 / Gate G1	À faire	Test d'isolation de deux entreprises (UI, API, RLS, worker).

Phases 2 à 5 — Modules produit

Aucun de ces modules n'est commencé. Ils suivent l'ordre de priorité de la spec : isolation, CRM, inbox, campagnes, IA, rapports.

Jours	Module	Statut	Gate
J16–J27	Ventes / CRM : projets, contacts et consentement, leads et deals, capture publique, assignation, import CSV, adaptateur CRM	À faire	G2 : lead → deal gagné avec historique
J28–J41	Canaux : intégrations et secrets, webhooks, e-mail, désabonnement, WhatsApp Cloud API, inbox unifiée	À faire	G3 : envoi, réception et arrêt sûrs
J42–J53	Croissance : campagnes, segments, approbation, UTM, agents IA, tableau de bord	À faire	G4 : campagne auditable, aucun envoi IA sans validation
J54–J62	Pilote SaaS : onboarding, Salla (mode marketing), console admin, durcissement, staging, recette	À faire	G5 : 10 critères d'acceptation

Avancement par phase (jours réalisés)

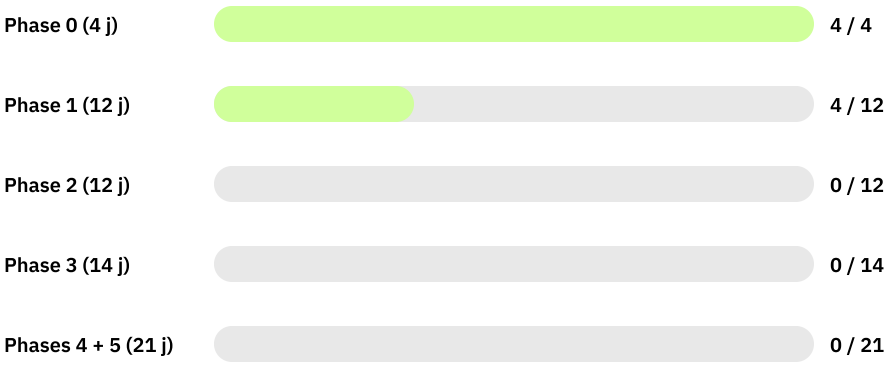


Fig. 1 — jours réalisés par phase (barres à l'échelle de la durée de chaque phase).

Qualité mesurée à ce jour

Les tests ont été vérifiés par « mutation » : retirer un trigger ou ouvrir une politique fait échouer les tests (16 échecs RLS provoqués, retour arrière 3 → 2 → 1 des migrations validé). Les règles de lint de schéma L1 à L10 s'appliquent à toute future table.

Points ouverts et blocages

- [ ] Lancer la CI : ouvrir une Pull Request vers **main** (le workflow ne tourne que sur PR ou push main) (jobs verify et database jamais exécutés)
- [ ] Accepter les ADR 001–008, 010–012, 014 (seule la responsable technique peut le faire ; C0 reste NO-GO provisoire)
- [ ] Répondre aux questions Q1 (CRM), Q2 (propriétaire du domaine e-mail), Q5 (marché / région)
- [ ] Compte développeur Meta : création bloquée (« compte trop récent »), WhatsApp critique pour J34
- [ ] Choisir l'hébergeur (ADR 010) avant J58 et le fournisseur IA (ADR 012) avant J47
- [ ] Resend : ADR 008 compare encore Postmark ; domaine SPF/DKIM à configurer
- [ ] Ouvert côté base : privilèges par défaut de `supabase_admin` sur `public` (atténué par lint de schéma et RLS automatique en staging)
- [ ] Coût par ligne de `has_role` à mesurer en J15 (risque R13)

Prochaines étapes

Quand	Action
Maintenant	Ouvrir la PR `day-07-rls-core-and-harness` → `main` et corriger ce que la première CI révèle.
J8	Auth SSR bilingue (AR/EN) : décision next-intl, lecture de la doc Supabase SSR, mini-plan puis validation avant de coder.
J9–J15	Organisations, invitations et RBAC, couche service, audit, worker, quotas, puis gate G1.

Lecture rapide

Vert = terminé. **Jaune** = terminé mais une validation ou une exécution manque. **Gris** = pas commencé. Sources : `docs/progress/journal.md`, `docs/plan/development-plan.md`, `docs/checkpoints/C0.md`.
